



Refugiés à Minawao

Refugiés hors Camp

56,838 **8,251****ANALYSE DES BESOINS**

Compte tenu de sous-sol pauvre en eau, l'adduction d'eau potable de Mokolo au camp de Minawao est essentielle afin de limiter l'épuisement de la nappe phréatique eu égard à l'augmentation constante de la population réfugiée. Ce nombre sans cesse en augmentation des réfugiés risque d'affecter gravement les populations locales autour de Minawao. L'atteinte du standard de 20 litres d'eau potable par personne par jour reste une priorité afin de contenir les épidémies et autres situations sanitaires dangereuses.

**DÉVELOPPEMENTS MAJEURS**

Au camp de Minawao, 1801 latrines sont fonctionnelles soit un ratio de 29 personnes par latrine. 1 792 douches fonctionnelles soit 32 personnes par douche.

Malgré l'incertitude de la nappe phréatique, le camp continue à être approvisionné en eau potable avec 66% de water trucking et 34% des forages. Pour pallier au défi d'eau dans le camp, le HCR en collaboration avec le gouvernement ont prévu la réalisation de l'adduction d'eau potable de Mokolo au camp sur 25 Km. Le niveau d'avancement des travaux est estimé globalement à presque 51% (fin mai). Le creusement de la tranchée pour la pose de la conduite principale est en cours de réalisation (64%).

Début des travaux des tranchées à l'intérieur du camp (40% de réalisation) et dans 4 quartiers de Mokolo.

Réhabilitation de la station de traitement d'eau avec la mise en place de 70m3 de massif filtrant.

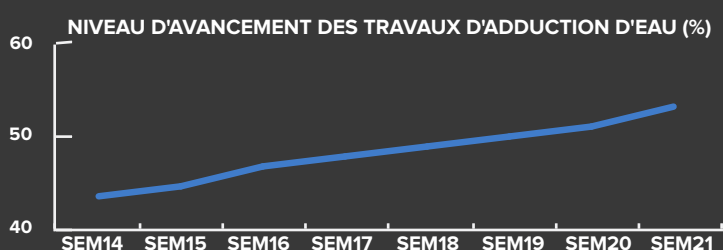
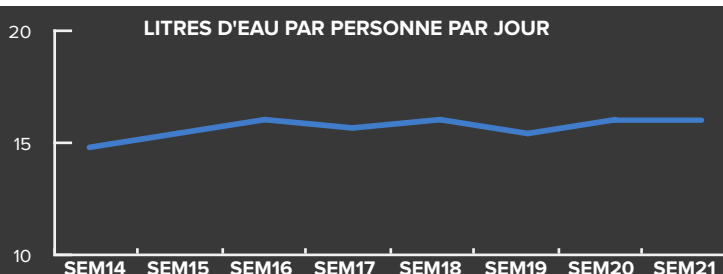


16 Litres d'eau par personne par jour
710 Personnes par promoteur d'hygiène
29 Personnes par latrine à Minawao
24 Fosses à ordures construites

DÉFIS

Le site est placé dans une zone de socle cristallin, avec une nappe phréatique pauvre. La solution est la construction d'une adduction d'eau potable de Mokolo Minawao.

La mobilisation de fonds pour étendre le réseau d'eau potable jusqu'au village de Gawar pour approvisionner les communautés hôtes et renforcer la coexistence pacifique. La gestion des déchets solides ménagers reste un des grands défis du secteur.

**CIBLES ET LES PROGRES REALISES**

	Total Assistés	Gap	CIBLES
Kits d'hygiène distribués	19878		20000
Poubelles distribuées	600		1400
Douches construites	1792		6424
Les ménages qui ont bénéficié de toilettes familiales	2551		6302
Systèmes de canalisation d'eau construits et entretenus	37		80

Cibles basées sur les chiffres de planification de 100000 réfugiés nigériens au Cameroun d'ici la fin 2016
