UNHCR NIGER, SOUS DELEGATION DIFFA

NIGER PROJET KALLO TCHIDANIWO A DIFFA 2017 - 2020

MOTS CLES: Construction, Coexistence Pacifique, Logements Sociaux, Résilience, Accès à l'Eau, Transition au Développement.

SOMMAIRE DU PROJET

Le Projet Kallo TCHIDANIWO est mis en œuvre conjointement par le HCR et les autorités du Niger. Il est orienté vers la résilience institutionnelle et communautaire. Il vise à :

- appuyer les communes à forte concentration de population à réaliser des projets de lotissement pour assurer l'accès au foncier et à l'eau;
- assurer l'accès aux logements sociaux pour 4,000 ménages;
- utiliser le secteur de la construction pour créer des opportunités d'emploi pour les communautés
- renforcer les capacités des communes leur permettant ainsi de réaliser des investissements via la mobilisation de ressources internes issues de la vente des parcelles.

COUT DU PROJET URBANISATION

12.95 million EUR Financé Par:

Union Européenne

BENEFICAIRES DU PROJET

650,000 habitants

dont 315,000 en situation de déplacement (Réfugiés, IDPs, Retournés)

LOCALISATION DU PROJET

7 communes

Chetimari, Diffa, Guesskerou, Maine-Soroa, N'Guigmi, Kablewa, Toumour.

PARTENAIRES

ANCSB, APBE, CISP, COOPI, Autorités Nigériennes.

SOUS -PARTENAIRES

Consortium Shimodu

POPULATION CIBLEE

25,200 personnes bénéficiant d'une parcelle, d'un logement social et de l'accès à l'eau;

42,000 personnes ayant accès au foncier pour le logement et à l'eau potable;

HABITATS ET INFRASTRUCTURES

7 d'infrastructures d'accès à l'eau à construire ou à améliorer;

3,600 maisons à construire

EXPERIENCES ACQUISES

1. Expérimentation de la technique de construction ISSB (Interlocking Stabilized Soil Blocks) dans la région de Diffa.
2. Mise en œuvre des activités du Consortium sur le site de Diffa permet d'accélérer l'installation des ménages bénéficiaires sur les sites.
3. Lotissement et vente de parcelles au profit des communes.
4. Opérationnalisation du Nexus Humanitaire-Développement.



1 30 Avril 2018: **Formation des 40 premiers jeunes de Diffa dans la technique de fabrication des briques ISSB.**

2 Juin 2018 **Construction de 10 maisons témoins**

3 Mai 2020 **Demande d'extension du projet de plus d'une année**

4 Juin - Juillet 2020 **Attaques sur les infrastructures hydrauliques à Assaga**

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS DU PROJET

+ Opportunités d'emploi aux jeunes (environ 1,212) pour réduire l'attrait vers les groupes armés.
+ Vente des parcelles ouvrant ainsi la voie à des opportunités pour les projets d'investissements des communes.
+ Synergie avec les partenaires de développement.
+ Opérationnalisation du nexus humanitaire-développement à travers le partenariat avec le Consortium Résilience Diffa EUTF.

DÉFIS LIÉS À LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

– Difficulté d'accès à certaines communes et sites de construction (Toumour) en raison de l'insécurité.
– Occupation prolongée du site de Diffa par les populations de N'Guagam (environ 230 ménages) suite à des attaques provoquant l'occupation anarchique du site de Diffa.
– Difficulté dans le ciblage occasionnant l'inoccupation des maisons.

Pour plus d'informations, contacter Maurice Azonnankpo (azonnank@unhcr.org).

Preparé par Information Management - Diffa, Cyrille Ble (ble@unhcr.org) 31 Décembre 2020

UNHCR NIGER, SOUS DELEGATION DIFFA

NIGER PROJET KALLO TCHIDANIWO A DIFFA 2017 - 2020

Progrès par rapport aux objectifs

2,747 maisons construites et entamées (au 31 Décembre 2020).
(2,409 terminées et 338 en cours de construction).
860 en projection pour la suite de la période d'extension.

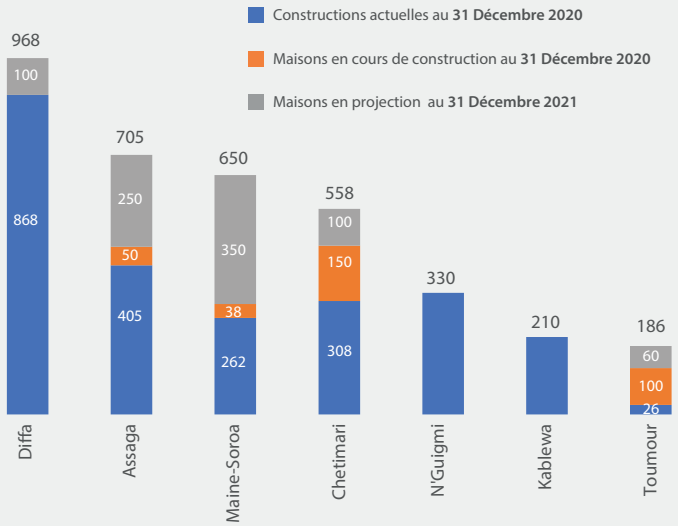

50,263 personnes ayant un accès amélioré à l'eau

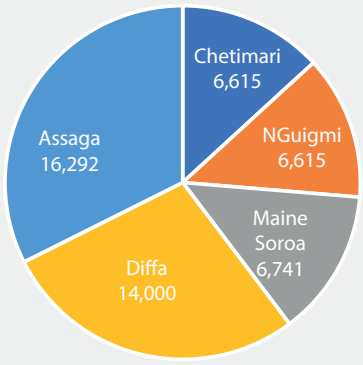

* L'infrastructure d'Assaga a été vandalisée en août 2020

5,785 personnes employées sur les chantiers sur 2,065 emplois prévus (1,159 nouveaux crées en Décembre 2020)

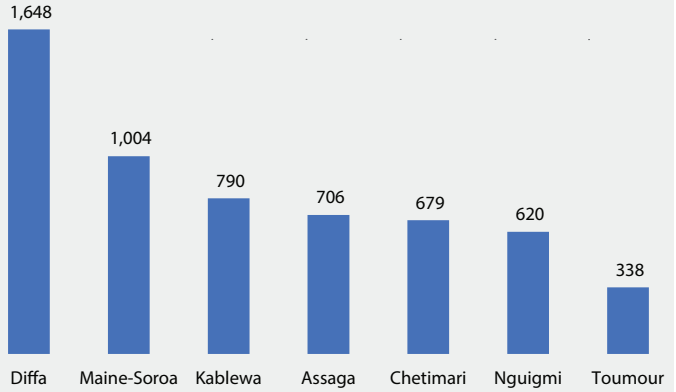

Infrastructures d'accès d'eau construites ou réhabilitées

Cible du Projet: **7**

Réalisé au 31 Octobre 2020 : **5** (Diffa, Assaga, Chetimari , N'Guigmi et Maine Soroa)

Perspective au 30 Juin 2021 : **2** (Toumour et Kablewa)

4,000 parcelles disponibles sur **6,000.**

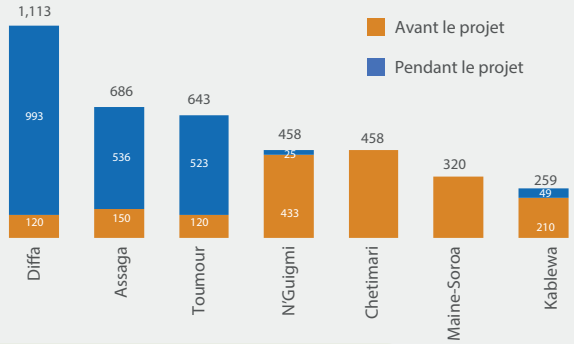

Projection des lotissements au 31 Décembre 2020

100 ha à Maine-Soroa ;

100 ha à Chetimari

29 membres de CAEUC formés et soutenus pour la gestion des enjeux d'urbanisation.

2,550 personnes formées à la construction selon l'approche ISSB (701) et sans bois (1,849).

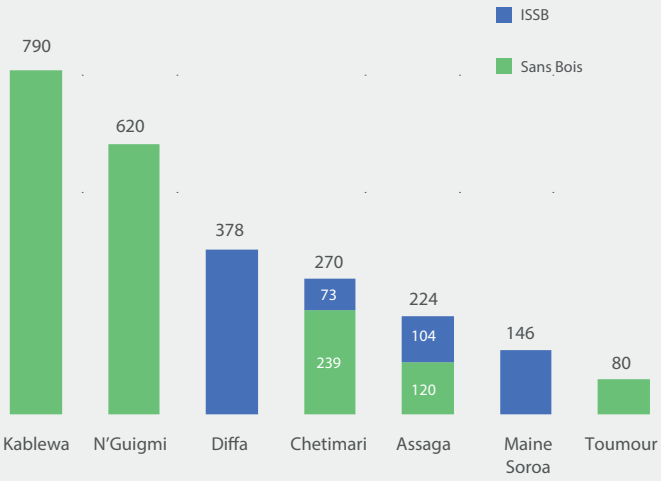

CAUEC: Comité d'Aménagement de l'Espace Urbain Comunal ; ISSB: Interlocking Stabilized Soil Blocks

Il n'y a pas de nouvelle formation pour le mois Décembre 2020.

La Sous-Délgation du HCR à Diffa tient à remercier chaleureusement l'Union Européenne, les autorités Nigériennes ainsi que tous ses partenaires pour leur engagement à la réussite de ce projet.

Pour plus d'informations, contacter Maurice Azonnankpo (azonnank@unhcr.org).

Preparé par Information Management - Diffa, Cyrille Ble (ble@unhcr.org) 31 Décembre 2020
